


QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN (Project Communication Management)



NỘI DUNG

- 7.1. Tổng quan về quản lý truyền thông
- 7.2. Xác định thông tin - Lập kế hoạch trao đổi thông tin
- 7.3. Phân phối thông tin - Xác định các kênh trao đổi thông tin
- 7.4. Báo cáo hiệu quả dự án
- 7.5. Tổng hợp thông tin quản lý

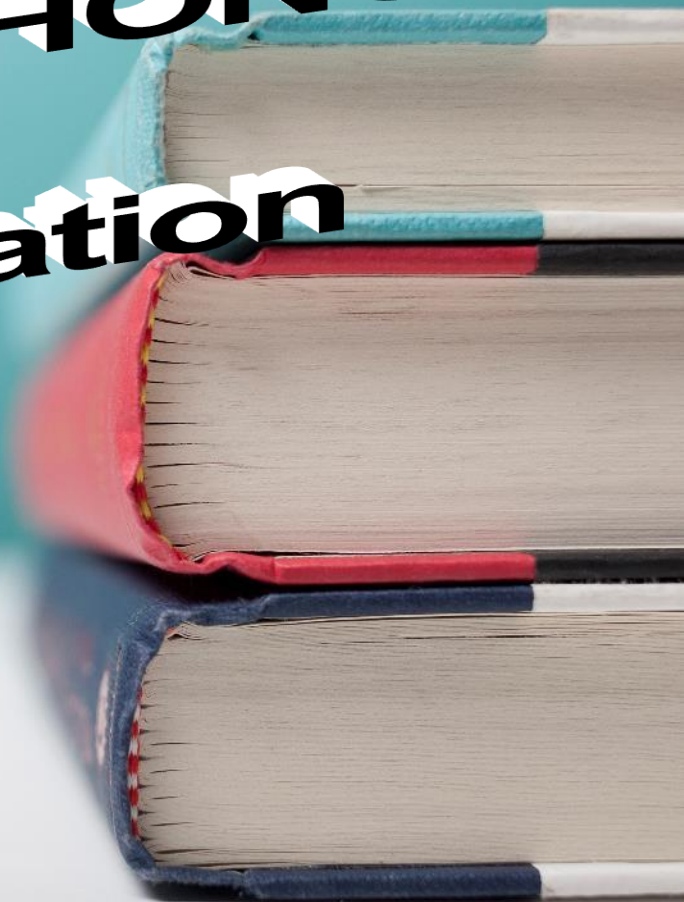

NỘI DUNG

- ❑ Tổng quan về truyền thông dự án
- ❑ Quy trình quản lý truyền thông
 - ❖ Lập kế hoạch và phân phối thông tin.
 - ❖ Báo cáo hiệu suất truyền thông
 - ❖ Xử lý xung đột truyền thông
 - ❖ Các phương pháp cải tiến truyền thông

1. Tổng quan về truyền thông dự án

- ❑ **Truyền thông** là truyền đạt thông tin và được nghe từ mọi người, và là về *sự hiểu biết đầy đủ, chính xác nội dung* của thông điệp.
- ❑ Người quản lý dự án phải sử dụng, và chuẩn bị thật tốt các kỹ năng để **giao tiếp** với tất cả các bên liên quan ở các cấp trong dự án, có ý thức **Nghe! và lắng nghe chi tiết!**

1.1. Nội dung của truyền thông dự án

- ❑ **Báo cáo định kỳ** về tiến độ và tình trạng của dự án là rất quan trọng cho sự thành công của dự án.
- ❑ Truyền đạt báo cáo này cho tất cả các bên liên quan một cách **rõ ràng và chính xác** là rất quan trọng, do đó trong các báo cáo, các công cụ giúp truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng bao gồm: Các sơ đồ, các biểu đồ, các đồ thị và các bảng.



1.1. Nội dung của truyền thông dự án

**Communications Management
makes sure everybody gets the
right message at the right time.**



1.2. Quản lý truyền thông dự án

Quản lý truyền thông dự án là các quy trình nhằm đảm bảo thông tin dự án được truyền thông chính xác đến **đúng người** và **đúng thời điểm**, và đảm bảo lập kế hoạch, thu thập, phân phối, lưu trữ, truy xuất, quản lý, kiểm soát, giám sát và xử lý thông tin dự án kịp thời và phù hợp.

1.2. Quản lý truyền thông dự án

- ❑ **90% công việc của người quản lý dự án là giao tiếp:** giao tiếp với các thành viên trong nhóm dự án, các bên liên quan, các thành viên ngoài dự án.
- ❑ Các hình thức **truyền đạt thông tin thông dụng:** Điện thoại, Fax, Email, Phần mềm nhắn tin, Cuộc họp, Skype, Facebook, Twitter, Blogger, ...



1.2. Quản lý truyền thông dự án



1.3. Vai trò của quản lý truyền thông dự án

- ❑ **Nếu Truyền thông không hiệu quả** sẽ gây ra **sự hiểu lầm** giữa các bên tham gia dự án và các thành viên trong nhóm dự án.



1.3. Vai trò của quản lý truyền thông dự án

❑ **Bất kỳ loại giao tiếp nào cũng có thể có nhiều.**

- ❖ Tiếng ồn có thể cắt xén đường truyền điện thoại
- ❖ Đường truyền internet không ổn định.
- ❖ Ký tự rác trong tin nhắn,

❑ Các quy trình **Quản lý Truyền thông** giúp **tránh các loại lỗi** phổ biến này, thông qua lập kế hoạch và theo dõi các thông tin liên quan của các bên liên quan trong dự án.

1.3.Vai trò của quản lý truyền thông dự án

- ❑ **Thành công của dự án** phụ thuộc vào **hiệu quả của truyền thông**. Quản lý truyền thông góp phần làm tối đa hóa thành công và giảm thiểu rủi ro.
- ❑ **Đe dọa lớn nhất đến thành công của bất kỳ dự án** nào chính là **sự thất bại về mặt truyền thông**, ở đó các thành viên dự án không giao tiếp được với nhau.



2.Quy trình quản lý truyền thông

- ☐ Xác định các bên liên quan (Identify Stakeholders)
- ☐ Lập kế hoạch truyền thông (Plan Communications)
- ☐ Phân phối thông tin (Distribute Information)
- ☐ Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan (Manage Stakeholder Expectations)
- ☐ Báo cáo hiệu suất (Report Performance)

2.1 Xác định các bên liên quan


- ❑ **Xác định các bên liên quan** là quá trình xác định tất cả những người hoặc tổ chức liên quan đến dự án.
- ❑ **Phân tích mức độ quan tâm, kỳ vọng, tầm quan trọng** và ảnh hưởng của họ đối với thành công của dự án.

2.1 Xác định các bên liên quan

❑ Phân tích các bên liên quan

- ❖ Cần phỏng vấn tất cả các bên liên quan tìm ra *giá trị mà dự án mang lại* cho họ.
- ❖ Chia các bên liên quan thành các nhóm dựa trên *mức độ tham gia* và *nhu cầu* của họ.
- ❖ *Xác định động cơ thúc đẩy* họ tham gia dự án, bạn có thể đưa ra một chiến lược để đảm bảo rằng họ đã nói về những điều mà họ thấy quan trọng.

2.1 Xác định các bên liên quan

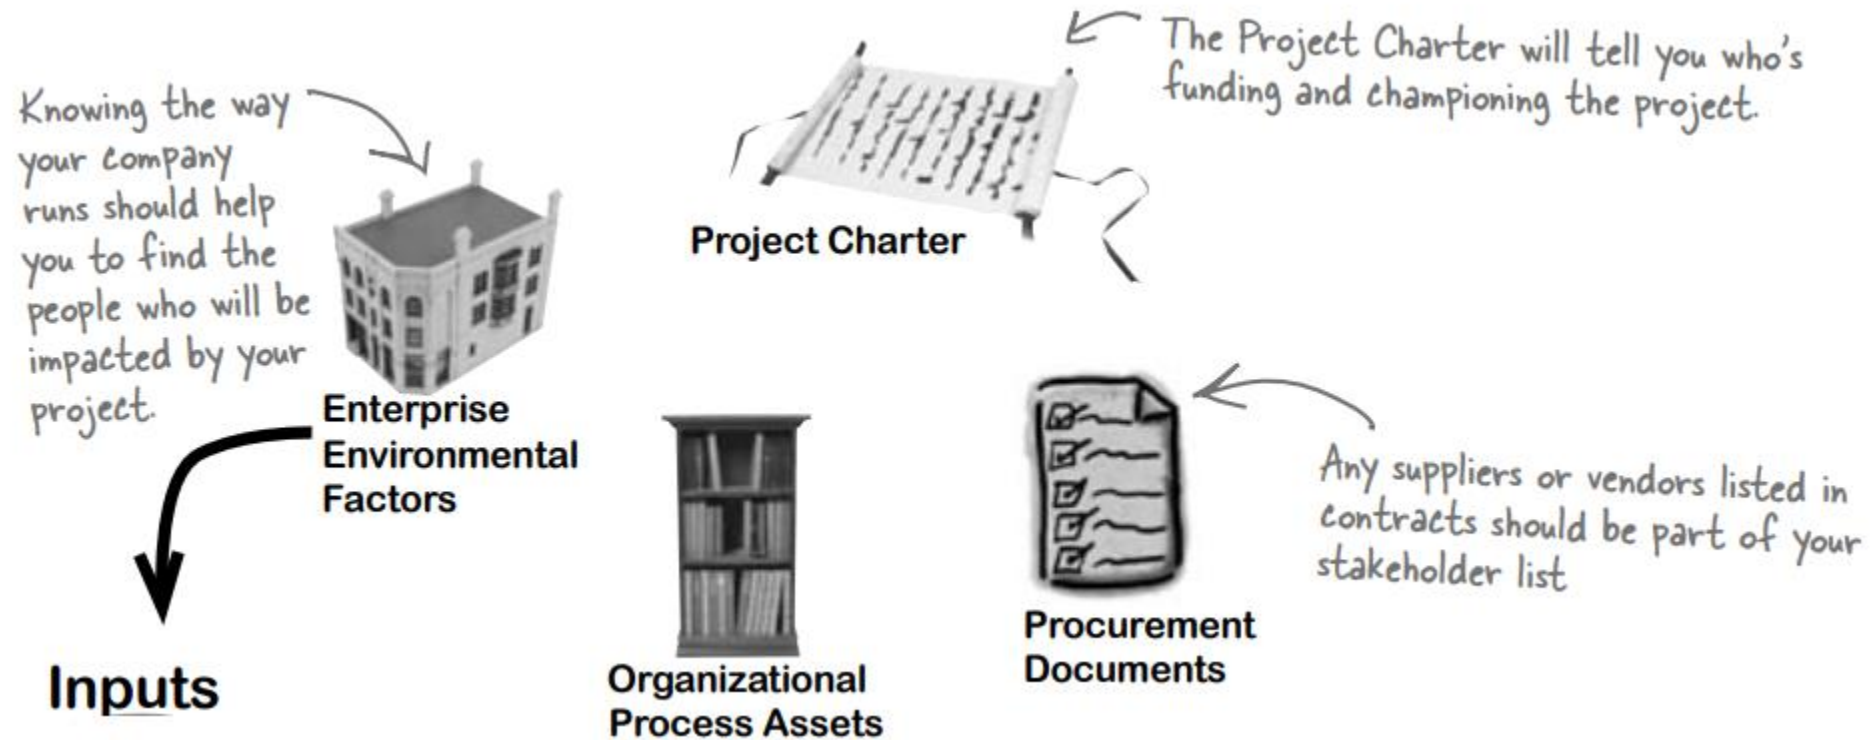

2.1 Xác định các bên liên quan

□ Thông tin đầu vào

❖ **Project Charter**: Điều lệ dự án cung cấp thông tin về nội bộ và bên ngoài bị ảnh hưởng bởi dự án:

- Nhà tài trợ dự án
- Khách hàng
- Thành viên trong nhóm.
- Các nhóm và các ban ngành tham gia dự án.
- Tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án

2.1 Xác định các bên liên quan

❑ Thông tin đầu vào

- ❖ **Tài liệu về các hợp đồng mua sắm (Procurement Documents):** Nếu một dự án là kết quả của một hoạt động mua sắm.
- ❖ **Các yếu tố môi trường (Enterprise Environmental Factors):** Biết cách thức hoạt động của công ty sẽ giúp nhóm dự án tìm ra những người sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án
- ❖ **Organizational Process Assets**

2.1 Xác định các bên liên quan

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện (Tools and Techniques)

- ❖ ***Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)***: là một quy trình thu thập và phân tích thông tin định tính và định lượng để xác định lợi ích của các bên tham gia
 - *Xác định tất cả các bên tham gia dự án tiềm năng và các thông tin liên quan, chẳng hạn như vai trò, phòng ban của họ, lợi ích, mức độ kiến thức, kỳ vọng, và mức độ ảnh hưởng*
 - *Xác định các tác động tiềm năng hoặc sự hỗ trợ mà các bên liên quan có thể tạo ra, và phân loại chúng để xác định một chiến lược tiếp cận.*
 - *Đánh giá các bên liên quan, để có kế hoạch tăng cường hỗ trợ của họ và giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng*



2.1 Xác định các bên liên quan

❑ Kết quả:

❖ Đăng ký các bên liên quan (Stakeholder Register)

- *Xác định thông tin*: Tên tổ chức, vị trí, vai trò trong dự án, thông tin liên lạc.
- *Đánh giá thông tin*: tiềm năng ảnh hưởng trong dự án.
- *Phân loại các bên liên quan* : nội bộ / bên ngoài...
- *Chiến lược quản lý* các bên liên quan

2.2 Lập kế hoạch quản lý truyền thông dự án

- ❑ **Kế hoạch quản lý truyền thông** xác định các **nhu cầu thông tin** của các bên liên quan của dự án và **phương pháp truyền thông**.
- ❑ **Mỗi dự án đều cần có kế hoạch quản lý truyền thông**, đây là tài liệu hướng dẫn truyền thông trong dự án.
- ❑ Kế hoạch quản lý truyền thông dự án đưa ra các **hướng dẫn** rõ ràng về cách thông tin sẽ được chia sẻ, người chịu trách nhiệm trong truyền thông dự án.



2.2 Lập kế hoạch quản lý truyền thông dự án

□ Thông tin đầu vào

- ❖ Đăng ký các bên liên quan (Stakeholder Register)
- ❖ Chiến lược quản lý các bên liên quan (Stakeholder Management Strategy)
- ❖ Yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environmental Factors)
- ❖ Quy trình tổ chức tài sản (Organizational Process Assets)

2.2 Lập kế hoạch quản lý truyền thông dự án

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện (Tools and Techniques)

❖ Phân tích yêu cầu truyền thông (Communication Requirements Analysis)

- Những yêu cầu được xác định bằng cách kết hợp các loại thông tin cần thiết với việc phân tích giá trị của thông tin.

❖ Các phương pháp được sử dụng để truyền thông tin giữa các bên liên quan của dự án

❖ Các hình thức thông tin được gửi và nhận



2.2 Lập kế hoạch quản lý truyền thông dự án

□ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

- ❖ Thông tin được sử dụng để xác định các yêu cầu truyền thông:
 - Sơ đồ tổ chức.
 - Tổ chức dự án và mối quan hệ trách nhiệm của các bên liên quan,
 - Nhu cầu thông tin nội bộ (ví dụ, giao tiếp giữa các tổ chức)
 - Nhu cầu thông tin bên ngoài (ví dụ, liên lạc với các phương tiện truyền thông, công cộng, hoặc nhà thầu)
 - Thông tin đăng ký và chiến lược quản lý các bên liên quan

2.3 Phân phối thông tin dự án

- ❑ Cung cấp thông tin cho đúng người vào đúng thời điểm và đúng định dạng.
- ❑ Nó được thực hiện trong suốt toàn bộ vòng đời dự án và trong tất cả các quy trình quản lý.
- ❑ Tập trung chủ yếu là trong quá trình thực hiện, trong đó bao gồm việc thực hiện kế hoạch quản lý thông tin liên lạc

2.3 Phân phối thông tin dự án

❑ Kỹ thuật phân phối thông tin (Communication Technology)

Các phương pháp được sử dụng để chuyển thông tin giữa các bên liên quan của dự án

- ❖ Mô hình người gửi-người nhận
- ❖ Phong cách viết
- ❖ Kỹ thuật quản lý cuộc họp
- ❖ Kỹ thuật trình bày
- ❖ Kỹ thuật tạo thuận lợi: Xây dựng sự nhất trí và khắc phục những trở ngại.



2.3 Phân phối thông tin dự án

❑ Kỹ thuật phân phối thông tin

❖ Hard-copy

❖ **Electronic communication:** e-mail, fax, thư thoại, điện thoại, hội nghị truyền hình và các trang web.

❖ **Electronic tools:** giao diện web để lập kế hoạch và phần mềm quản lý dự án, phần mềm hỗ trợ văn phòng ảo, cổng thông tin.

2.4 Báo các hiệu suất

- ❑ **Báo cáo hiệu suất** là quá trình thu thập và phân phối thông tin hiệu suất, bao gồm cả báo cáo tình trạng, đo lường sự tiến độ, và dự báo.
- ❑ Quá trình báo cáo hiệu suất liên quan đến việc thu thập định kỳ và phân tích cơ bản so với các dữ liệu thực tế để biết tiến độ dự án và hiệu suất cũng như để dự báo kết quả của dự án.

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Thông tin đầu vào

- ❖ **Kế hoạch quản lý dự án:** cung cấp thông tin về đường cơ sở dự án, là một kế hoạch đã được phê duyệt cho công tác dự án.
- ❖ **Thông tin về quá trình thực hiện công việc dự án:** thông tin từ các hoạt động của dự án được thu thập trên kết quả thực hiện, bao gồm:
 - Tình trạng của sản phẩm trung gian
 - Lịch trình tiến độ
 - Chi phí phát sinh.

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Thông tin đầu vào

- ❖ **Thông tin hiệu suất làm việc** được sử dụng để tạo ra các số liệu hoạt động dự án để đánh giá tiến độ thực tế so với kế hoạch
- ❖ **Dự báo ngân sách** cung cấp thông tin về các khoản tiền bổ sung dự kiến sẽ được yêu cầu cho công việc còn lại và ước tính cho việc hoàn thành dự án

2.3 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện


- ❖ **Phân tích nguyên nhân** gây ra sự khác biệt giữa các đường cơ sở và việc thực hiện thực tế, gồm các bước:
 - Kiểm tra chất lượng của các thông tin thu thập được để đảm bảo rằng nó là hoàn chỉnh, phù hợp với dữ liệu quá khứ, và đáng tin cậy
 - Xác định chênh lệch, so sánh các thông tin thực tế với các đường cơ sở dự án và ghi nhận tất cả các sự khác biệt có cả thuận lợi và không thuận lợi cho kết quả dự án.
 - Xác định tác động của sự chênh lệch trong chi phí và tiến độ dự án và các lĩnh vực khác của dự án

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

❖ Sử dụng phân tích giá trị thu được (Using Earned Value Analysis)


$$EV = \% \text{ kế hoạch hoàn thành} \times BAC$$

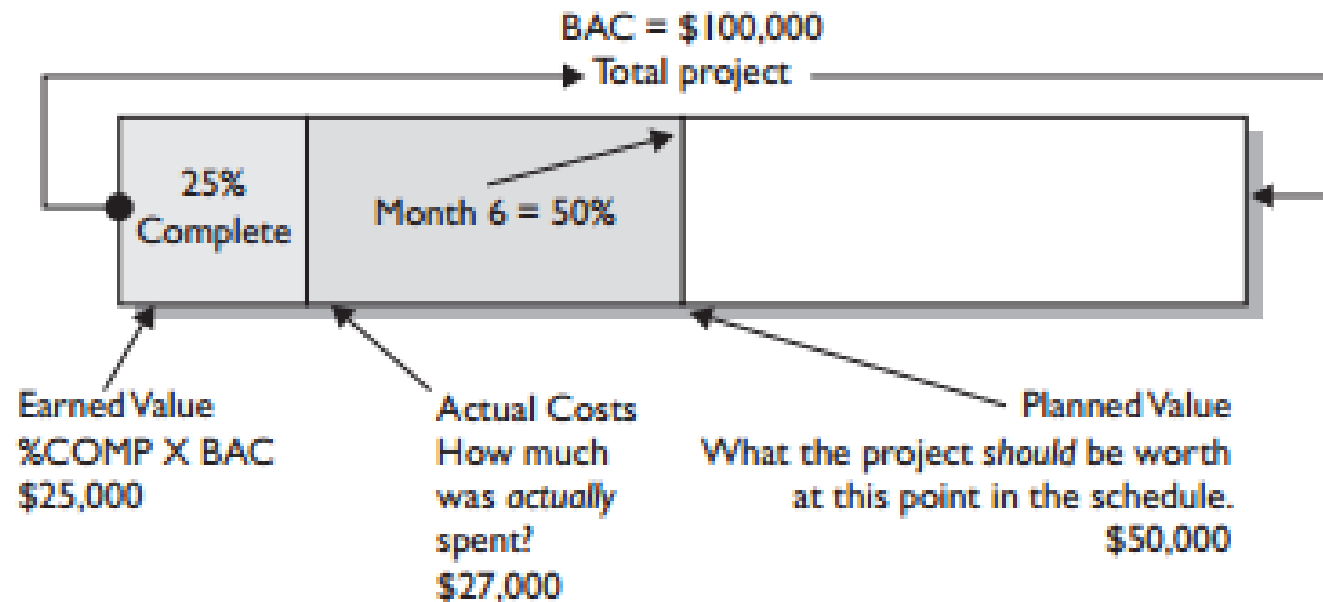

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

- ❖ **Chênh lệch:** khi kết thúc dự án thì độ lệch về ngân sách $VAR = BAC - AC$ luôn có sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế.
- ❖ **Chi phí chênh lệch (Cost Variances-CV):** là sự khác biệt giữa giá trị thu được EV và thực tế chi phí AC: $CV = EV - AC$

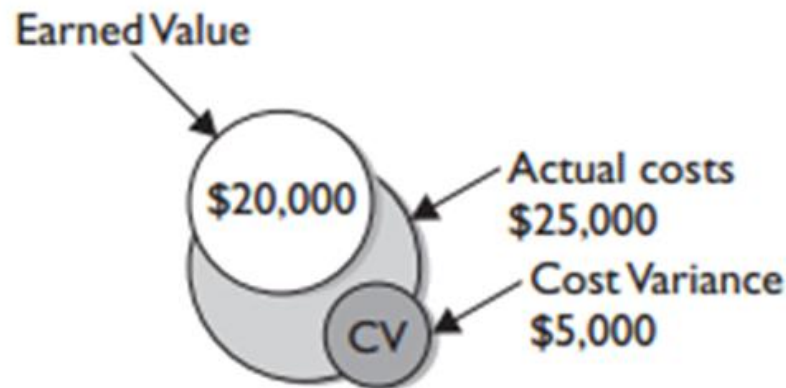

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

❖ Chênh lệch lịch biểu (Schedule Variances-SV):

❖ Ví dụ:


- Một dự án với kinh phí \$ 200.000 dự kiến trong hai năm.
- Cuối của một năm, nhóm dự án đã lên kế hoạch dự án sẽ được hoàn thành 60%. Giá trị theo kế hoạch $PV = \$120,000$.
- Tuy nhiên, vào cuối năm thứ nhất, dự án chỉ hoàn thành 40%, vào cuối năm thứ nhất, $EV = \$80.000$.
- Sự khác biệt giữa PV và EV là $SV = EV - PV$.

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

❖ **Chỉ số CPI:** số lượng công việc của dự án được hoàn thành trên số kinh phí dành cho dự án.

– Ví dụ: Dự án có $EV = \$20.000$ và $AC = \$25.000$.

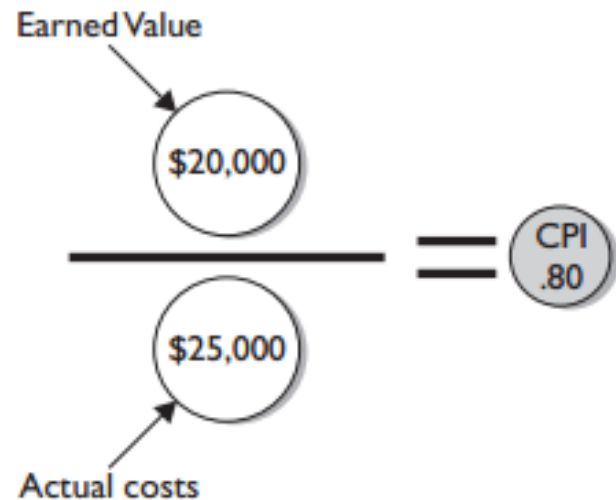

$$CPI = EV/AC = 0.80.$$

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

❖ **Schedule Performance Index –SPI**: cho biết dự án có đúng tiến độ hay không

- $EV = \$20.000$, và $PV = \$30.000$.
- $SPI = EV/PV = 0.67$ chệch mục tiêu!

2.4 Báo các hiệu suất


□ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

- ❖ **Estimate at Completion -EC**: là một dự báo chi phí cuối cùng của dự án.
- ❖ Ví dụ: $EAC = BAC / CPI$. Dự án có $BAC = \$200.000$, Chỉ số $CPI = 0,80 \rightarrow EAC = 250.000 \text{ USD}$.

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Công cụ và kỹ thuật thực hiện

- ❖ **EAC**: là một dự báo chi phí cuối cùng của dự án.
- ❖ Ví dụ: $EAC = BAC / CPI$. Dự án có $BAC = \$200.000$, Chỉ số $CPI = 0,80 \rightarrow EAC = 250.000 \text{ USD}$.

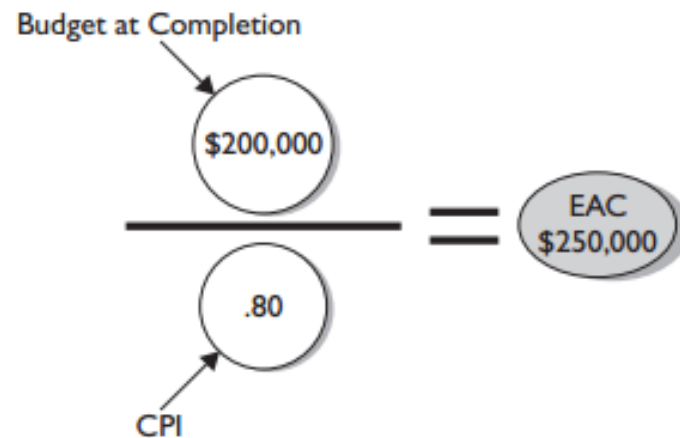

2.4 Báo các hiệu suất

❑ Kết quả

- ❖ Báo cáo cần cung cấp các thông tin trạng thái và tiến độ, ở mức độ chi tiết theo yêu cầu của các bên liên quan khác nhau, như tài liệu trong kế hoạch quản lý thông tin liên lạc.
- ❖ Các định dạng phổ biến cho báo cáo hiệu suất bao gồm các biểu đồ thanh, biểu đồ, và bảng

2.5 Kế thúc hành chính

- ❑ Dự án đòi hỏi phải có giai đoạn kết thúc.
- ❑ Kết thúc hành chính (Administrative closure) tạo ra:
 - ❖ Tài liệu lưu trữ về dự án.
 - ❖ Chấp nhận chính thức.

2.6 Cải tiến truyền thông

❑ **Quản lý xung đột hiệu quả:** Giải quyết vấn đề: trực tiếp đối mặt với xung đột

❖ **Thỏa hiệp:** dùng tiếp cận cho và nhận.

❖ **Làm trơn (Smoothing):** nhấn mạnh những điểm đồng tình và bỏ qua những khác biệt.

❖ **Áp đặt (Forcing):** dùng tiếp cận thắng-thua.

❖ **Rút lui:** rút lui do không đồng tình.

2.6 Cải tiến truyền thông

❑ Phát triển kỹ năng truyền thông tốt hơn

- ❖ Các công ty thường không chú ý đến tầm quan trọng của phát triển kỹ năng nói, viết, và nghe.
- ❖ Khi công ty ngày càng mang tính toàn cầu, họ ý thức rằng cần phải đầu tư để cải tiến truyền thông với những người có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.
- ❖ Để cải tiến truyền thông cần có sự lãnh đạo.

2.6 Cải tiến truyền thông

❑Họp hiệu quả hơn

- ❖Xác định định có nên tránh được buổi họp nào không.
- ❖Xác định mục đích và kết quả đạt được của buổi họp.
- ❖Xác định những người tham gia cuộc họp.
- ❖Cung cấp chương trình họp cho người tham gia trước buổi họp.
- ❖Chuẩn bị tài liệu và các hỗ trợ trực quan.
- ❖Tiến hành cuộc họp một cách chuyên nghiệp.
- ❖Xây dựng quan hệ.

2.6 Cải tiến truyền thông

❑Dùng email hiệu quả

- ❖Bảo đảm email là phương tiện truyền thông hiệu quả.
- ❖Bảo đảm gửi e-mail đến đúng người.
- ❖Các đề trong email phải phù hợp.
- ❖Giới hạn nội dung cho một chủ đề chính, càng rõ ràng và súc tích càng tốt.
- ❖Giới hạn số lượng và kích thước các tập tin đính kèm.
- ❖Bảo đảm luôn cập nhật phần mềm chống virút (virus).
- ❖Trả lời nhanh các email. Học cách sử dụng các tính năng hữu ích.

2.7 Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan

- ❑ **Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan** là quá trình giao tiếp và làm việc với các bên liên quan để đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết các vấn đề nếu có
- ❑ Quản lý kỳ vọng giúp để tăng xác suất thành công của dự án bằng cách đảm bảo rằng các bên liên quan hiểu rõ những lợi ích và rủi ro của dự án

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

I. PHẦN PHÂN TÍCH

1. Bối cảnh diễn ra sự kiện
2. Tổng quan về môi trường bên ngoài
3. Các đối tượng liên quan tới sự kiện

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

II. PHẦN LẬP KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu
2. Công chúng mục tiêu
3. Chiến lược
4. Tuyên bố
5. Thông điệp truyền thông
6. Chiến thuật tiến hành
7. Phân tích rủi ro
8. Dự trù kinh phí
9. Tiêu chí đánh giá



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

I. PHẦN PHÂN TÍCH

1. Bối cảnh diễn ra sự kiện

- Định vị thương hiệu doanh nghiệp của bạn?
- Sự kiện của bạn là về vấn đề gì? Mục đích sự kiện là gì?
- Kế hoạch thực hiện có bao gồm sự kiện nhỏ nào (hội thảo, triển lãm, cuộc thi,...) bên trong không?
- Có các mốc thời gian quan trọng nào?
- Lực lượng tham gia chính trong sự kiện? Trong công ty bạn có những ai tham gia? Có sự góp mặt của những tổ chức bên ngoài nào? Có đối tác đồng tổ chức nào không?

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

I. PHẦN PHÂN TÍCH

1. Bối cảnh diễn ra sự kiện
2. Tổng quan về môi trường bên ngoài

Để phân tích môi trường ngoài, bạn có thể chọn 1 trong 2 mô hình: mô hình PEST và SWOT.

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

- **Mô hình PEST (Political - Chính trị, Economic - Kinh tế, Social - Xã hội, Technological - Công nghệ)** là một mô hình hữu ích để lần lượt xác định những ảnh hưởng của từng khía cạnh thị trường tác động tới sự kiện của bạn. Tuy nhiên mô hình chỉ phù hợp nhất với các sự kiện có tầm cỡ.
- **Mô hình SWOT (Strengths - Điểm mạnh, Weaknesses - Điểm yếu, Opportunities - Cơ hội, Threats - Thách thức)** cũng là mô hình hiệu quả. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu sẽ cho bạn cái nhìn tập trung vào nội lực của chính doanh nghiệp. Cơ hội và thách thức sẽ là bức tranh phác thảo khi đưa sự kiện của bạn ra tổ chức bên ngoài.



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

Môi trường cạnh tranh

SWOT

- Thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng quốc tế.
- Sản phẩm Tiện lợi.
- Có nhiều mức giá để lựa chọn
- Hương vị phong phú

S

W

- Sản phẩm Snack Bột không được đánh giá "cao cấp" bằng Snack Khoai Tây, chưa có những câu chuyện thương hiệu hấp dẫn để kể như Snack Khoai Tây

O

T

- Xu hướng phát triển ngành hàng đồ ăn nhanh và đồ ăn giải trí đang ngày càng tăng tại Việt Nam, do nhu cầu giải trí của giới trẻ ngày 1 nâng cao cùng sự ra đời của những Trung tâm thương mại, Rạp chiếu phim

- Có nhiều tin đồn không tốt, thông tin xấu gây ảnh hưởng uy tín về sản phẩm từ năm 2012.
- Nhiều sản phẩm ở nhiều phân khúc nên cùng lúc bị cạnh tranh bởi nhiều đối thủ.
- Chi tiêu thời bão giá, khủng hoảng bị thắt chặt hơn

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

Một số gợi ý sau có thể giúp bạn điền vào các mục trong mô hình phân tích:

- ☐ Đâu là đối thủ của bạn? Gần đây họ đã làm gì? Họ đã từng có một sự kiện tương tự chưa? Điều gì khiến khách hàng quan tâm tới bạn mà không phải đối thủ cạnh tranh và ngược lại?
- ☐ Pháp luật và văn hoá có ủng hộ điều bạn đang làm không?
- ☐ Thái độ của công chúng về đề tài của sự kiện như thế nào? Có hot trend nào có thể giúp ích cho sự kiện này hay không?
- ☐ Xu hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh của bạn là gì?
- ☐ Những thành phần kinh tế nào liên quan tới sự kiện của bạn?

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

I. PHẦN PHÂN TÍCH

1. Bối cảnh diễn ra sự kiện
2. Tổng quan về môi trường bên ngoài
3. Các đối tượng liên quan tới sự kiện

Các đối tượng bạn mong muốn và thực sự có ảnh hưởng bởi sự kiện. Đó có thể là khách hàng trực tiếp, nhà phân phối, nhà đầu tư, báo chí,... Từng đối tượng sẽ được phân tích đặc điểm, các cộng đồng liên quan và cách họ có thể phản ứng lại với sự kiện.

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

II. PHẦN LẬP KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

- Hãy nghĩ xem bạn đang cố gắng để đạt được điều gì trong kế hoạch truyền thông của mình? Ví dụ:
- Bạn có muốn giới thiệu sản phẩm mới không? Bằng cách tạo ra nhu cầu mới hay khơi gợi lên nhu cầu có sẵn?
- Bạn đang tìm kiếm sự ủng hộ từ công chúng hay muốn xoa dịu một vấn đề nào đó?
- Bạn có muốn nâng cao danh tiếng của công ty bạn không?

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

II. PHẦN LẬP KẾ HOẠCH


1. Mục tiêu

- ❑ Đừng quên đặt mục tiêu của bạn đáp ứng được 5 tiêu chí SMART (Specific - Cụ thể, Measurable - Có thể đo lường được, Achievable - Có thể đạt được, Relevant - Có liên quan, Time-bound - Có giới hạn thời gian).

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

Mục tiêu

Ấn tượng/ Kết quả đọng lại

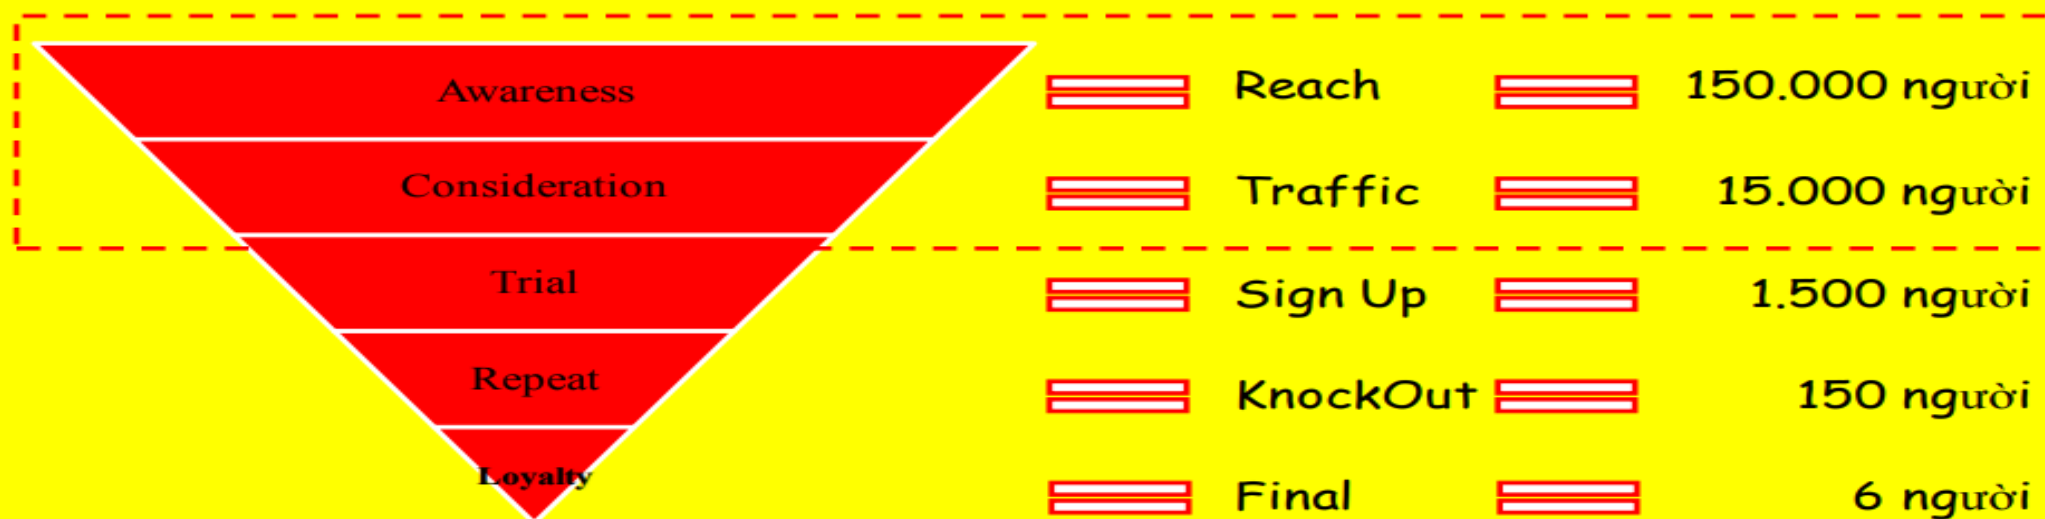

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

2. Công chúng mục tiêu: Một số nhóm tiềm năng có thể trở thành công chúng của bạn:

- Những người có tiếng nói trong cộng đồng
- Các nhóm chuyên gia, nhà phân tích chuyên môn trong lĩnh vực
- Chính phủ
- Nhân viên trong doanh nghiệp
- Công chúng trên mạng (ví dụ: các nhóm trên mạng xã hội, các cộng đồng đặc biệt, các blogger)
- Báo chí

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

3. Chiến lược: Sau khi biết được bạn muốn đi đến đâu và tiếp cận tới những ai, đã đến lúc xác định cách thức thực hiện.

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Bạn sẽ sử dụng các công cụ nào?
- Bạn muốn chủ động đem thông tin tới công chúng mục tiêu hay chờ đợi họ tìm kiếm?
- Quá trình tiếp cận của bạn sẽ diễn ra như thế nào?
- Trình tự xuất hiện trên báo chí và các social media của bạn ra sao?



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

4. Tuyên bố:

- Tuyên bố của bạn chỉ có độ dài 1 hoặc 2 câu ngắn gọn, nhưng lại chính là phần tổng kết ngắn gọn và đầy đủ nhất của toàn bộ kế hoạch bạn sẽ thực hiện.
- Tuyên bố này sẽ theo bạn trong suốt quá trình xây dựng ý tưởng truyền thông và cả khi diễn ra sự kiện. Bởi vậy, hãy làm nổi bật nó trong bản kế hoạch và in ra nhiều bản rời nếu có thể.



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

5. Thông điệp truyền thông: Bạn cần chú ý những điều sau khi xây dựng thông điệp:

- Thông điệp cần phù hợp với mục tiêu
- Thông điệp cần chuyển tải những gì đặc biệt và mới mẻ trong sự kiện
- Có thể sử dụng các con số và tên riêng để tăng tính cụ thể
- Thông điệp cần bao quát tất cả công chúng mục tiêu: có thể là một thông điệp chung cho tất cả các đối tượng, hoặc mỗi nhóm công chúng có một thông điệp khác nhau.




Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

6. Chiến thuật tiến hành:

Chiến thuật

Kế hoạch triển khai: Tactic 3

- Sử dụng sức hấp dẫn của Giải thưởng giá trị để thu hút sự quan tâm, chia sẻ về cuộc thi => Hỗ trợ tăng Traffic, Share

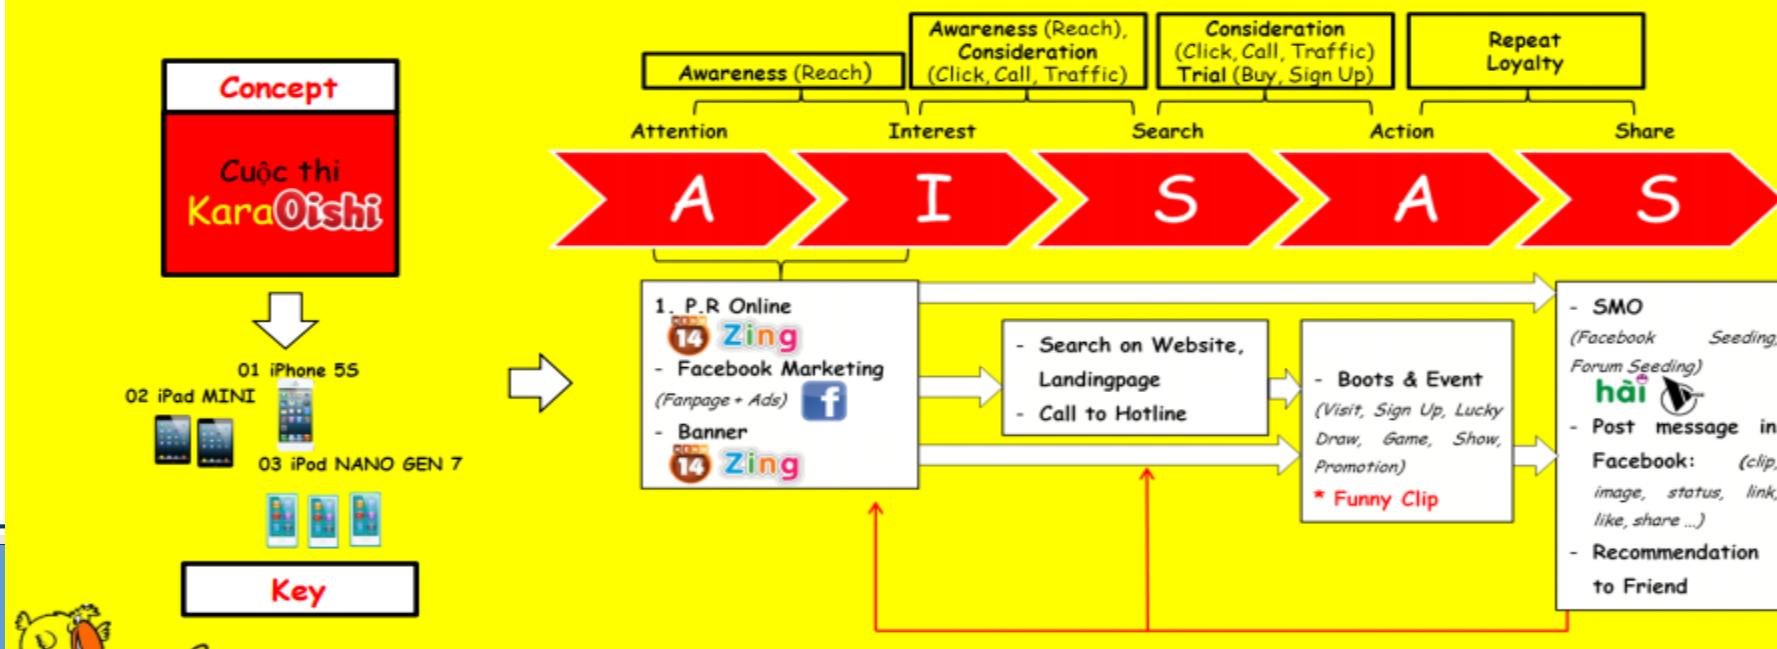

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

6. Chiến thuật tiến hành:

Chiến thuật

Kế hoạch truyền thông: Timeline

Campaign	11/2013			12/2013				1/2014		Cost Unit 1000VNĐ	
	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2		
	Pre-launching (Introduce)		Qualifying Round (Review)					Vote Round Before Final Round (Remind & Review)			
Reach & Frequency	LOW		HEAVY		MEDIUM		HEAVY		MEDIUM		
PR		2 Advertorial							2 Advertorial	20.000	
FB Ads			10 days					5 days			15.000
Online Ads		2 banner	1 banner								50.000
SMO (Seeding)			5 Fanpage 2 Forum					5 fanpage			25.000
POSM			20.000 leaflet & lucky draw ticket (2 in 1) + 200 poster							20.000	
Creative & Copywriting	Copywriting + Design+ Photograph + Fanpage Management + Landing Page + hotline									40.000	
Total										170.000	

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

6. Chiến thuật tiến hành: Bạn có thể sử dụng bảng liệt kê để đảm bảo mỗi nhóm công chúng đều đã có mặt trong 2 hoặc 3 chiến thuật.

	Chiến thuật 1	Chiến thuật 2	Chiến thuật 3	Chiến thuật 4	Chiến thuật 5
Công chúng 1	x		x	X	
Công chúng 2		X	X		X
Công chúng 3	x	x	x		
Công chúng 4		x	x		X
Công chúng 5	x	x			X



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

7. Phân tích rủi ro: là một tiêu chí quan trọng trong tuyển dụng các vị trí liên quan tới PR - Event. Bất kỳ kế hoạch truyền thông sự kiện nào cũng cần dự tính trước tới các rủi ro có thể phát sinh và chuẩn bị sẵn phương án đối phó.

- Thông thường, phần nội dung này được trình bày dưới dạng Q&A để đảm bảo độ dễ hiểu và logic cho người đọc.
- Ví dụ:
 - ❖ Q: Sẽ xử lý như thế nào nếu có khán giả quá khích trong buổi chơi trò chơi phát quà?
 - ❖ A: Dịch vụ trọn gói của công ty hỗ trợ sự kiện đã bao gồm lực lượng an ninh gồm 3 người. Một người được sắp xếp đứng bên cạnh cổng chào, một người ở khu vực chơi trò chơi và một người đứng cạnh bàn phát quà. Họ sẵn sàng ngăn cản khán giả quá khích và các sự cố an ninh khác.

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

8. Dự trù kinh phí:

- Kế hoạch truyền thông của bạn sẽ chẳng đi được đến đâu cả nếu không có ngân sách. Mọi đề xuất bên trên của bạn đều cần tương ứng với một con số kinh phí dự trù. Các con số càng chi tiết tới từng hạng mục thì kế hoạch càng dễ được duyệt.
- Dự trù kinh phí cũng giúp bạn cân đối được mục tiêu kế hoạch và năng lực tài chính của công ty.



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

9. Tiêu chí đánh giá:

- Một lần nữa nhìn lại mục tiêu của bạn. Làm thế nào để đo được thành công của chiến dịch truyền thông sự kiện, đánh giá được bạn hoàn thành bao nhiêu % mục tiêu?
- Nếu kế hoạch của bạn được chia giai đoạn, quy trình đánh giá của bạn cũng cần đi theo các giai đoạn đó. Hãy cố gắng đặt ra các thước đo sát nhất với những gì bạn dự định làm trong suốt sự kiện.



Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

9. Tiêu chí đánh giá:

Ví dụ:

- Có bao nhiêu báo đài đã đưa tin về sự kiện? Có bao nhiêu trong số đó nằm trong mục tin tức nổi bật? Họ có trích dẫn lời phát biểu hay sử dụng hình ảnh bạn cung cấp không?
- Các bài đăng trên Facebook có bao nhiêu lượt tiếp cận và lượt tương tác?
- Traffic của website như thế nào? Tỷ lệ bỏ trang và thời gian trung bình trên trang là bao nhiêu?
- Bạn đã gửi được bao nhiêu email marketing? Tỷ lệ phản hồi là bao nhiêu?
- Có bao nhiêu bài đăng nhắc đến sự kiện của bạn trên Facebook?

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1		BIỂU MẪU LÊN LỊCH ĐĂNG BÀI TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN																			
2		Tuần																			
3		21-thg 2	28-thg 2	7-thg 3	14-thg 3	21-thg 3	28-thg 3	4-thg 4	11-thg 4	18-thg 4	25-thg 4	2-thg 5	9-thg 5	16-thg 5	23-thg 5	30-thg 5	6-thg 6	13-thg 6	20-thg 6	Người thực hiện	Trạng thái
4	Email Marketing																				
5	Nội dung bản tin tháng 3	Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi			Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi												Đã hoàn thành
6	Nội dung bản tin tháng 4						Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi												Đã hoàn thành
7	Nội dung bản tin tháng 5									Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi									Chưa bắt đầu
8	Nội dung bản tin tháng 6															Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi			Chưa bắt đầu
9																					
10	PR / Phát hành																				
11	Thông báo "Save the date"	Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi																	Đã hoàn thành
12	Bản vẽ				Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi														Đã hoàn thành
13	Nhà tài trợ chính / Người tham gia đầu giá								Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi										Đang làm
14	Công bố danh sách người tham gia đầu giá												Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi						Chưa bắt đầu
15	Thông báo sau sự kiện																Đang làm	Đã duyệt	Gửi đi		Chưa bắt đầu
16	Phát hành Daybook			Đăng lên															Đăng lên		Đang làm
17	Lịch phát sóng sự kiện online								Đăng lên												Đang làm
18	Phương tiện truyền thông chính												Research								Chưa bắt đầu
19																					
20	Chương trình sự kiện																				
21	Lên concept thiết kế chương trình						30-thg 3														Chưa bắt đầu
22	Phát triển nội dung							Lên kế hoạch													Chưa bắt đầu
23	Logo và giới thiệu về nhà tài trợ							15-thg 4													Chưa bắt đầu
24	Quảng cáo do nhà tài trợ										28-thg 4										Chưa bắt đầu
25	Thông tin về người tham gia đầu giá											6-thg 5									Chưa bắt đầu
26	Bố cục và thiết kế																				Chưa bắt đầu
27	Phê duyệt lần cuối												19-thg 5								Chưa bắt đầu
28	Gửi tới nhà in													23-thg 5							Chưa bắt đầu
29	In và hoàn thành																				
30	Phân phối các chương trình																		13-thg 6		
31																					
32	Đồ họa																				
33	Biểu đầu giá													Thiết kế	23-thg 5						Chưa bắt đầu
34	Biểu chỉ dẫn													Thiết kế	23-thg 5						Chưa bắt đầu
35																					
36	Website																				
37	Trang tổng quan	Review	Update																		Đã hoàn thành
38	Gói tài trợ	Review	Update																		Đã hoàn thành
39	Thông tin nhà tài trợ	Review	Update	Thêm mới		Thêm mới		Thêm mới													Đã hoàn thành
40	Trang đăng ký	Review	Update																		Đã hoàn thành
41	Công nghệ đầu giá giấu mặt	Review	Update																		Đã hoàn thành
42	Thông tin địa điểm	Draft	Thêm mới																		Đã hoàn thành
43	Thông tin người tham gia đầu giá			Thêm mới		Thêm mới		Thêm mới		Thêm mới		Thêm mới		Thêm mới		Thêm mới					Đang làm
44	Thông cáo báo chí			Đăng lên		Đăng lên													Đăng lên		Đang làm
45																					
46	Tiếp thị liên kết																				
47	Mô tả sự kiện - 100 từ											Draft	Đã duyệt	Gửi đi							Chưa bắt đầu
48	Mô tả sự kiện - 50 từ											Draft	Đã duyệt	Gửi đi							Chưa bắt đầu
49	Logo											Draft	Đã duyệt	Gửi đi							Chưa bắt đầu

Mẫu kế hoạch quản lý truyền thông

<https://www.bing.com/videos/search?q=c%c3%a1c+video+v%e1%bb%81+truy%e1%bb%81n+th%c3%b4ng+s%e1%ba%a3n+ph%e1%ba%a9m&docid=608035393866043007&mid=6148C05D384B788D55756148C05D384B788D5575&view=detail&FORM=VIRE>

<https://ssyoutube.com/en5/youtube-video-downloader>
